

- Travaux :**
- Installation base vie
 - Terrassement
 - Reprise EP
 - Réalisation de sondage pour feeder et AEP

Travaux de nuit
Bd fermé à la circulation

Déplacement
arrêt de bus

Base vie

- Circulation:**
- Bd Gaye :**
- Modification des voies avec emprise sur stationnement existant
- Bd de Sainte-Marguerite :**
- **Bd ferme durant travaux de nuits (traversées de chaussée)**
 - Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie

- LEGENDE**
- Circulation existante
 - Circulation modifiée
 - Circulation piétons
 - Feux tricolores existant
 - Feux tricolores Déplacé
 - Zone de travaux
 - Zone voirie provisoire
 - HERAS
 - GBA

Feux tricolores existant sur potence



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)


PHASE 0
Démolition et construction mur

Date:
20/10/2025

Indice:
A

- Travaux :**
- Terrassement
 - Démolition mur
 - Réalisation nouveaux mur
 - Reprise EP
 - Dévoiement AEP
 - Dévoiement HTA / Télécom
 - Pose feeder Dn600
 - Réalisations réseaux secs
 - Structures voirie jusqu'à la GB
 - Bordures
 - Réalisation du trottoir


Travaux réalisés en période de vacances scolaire

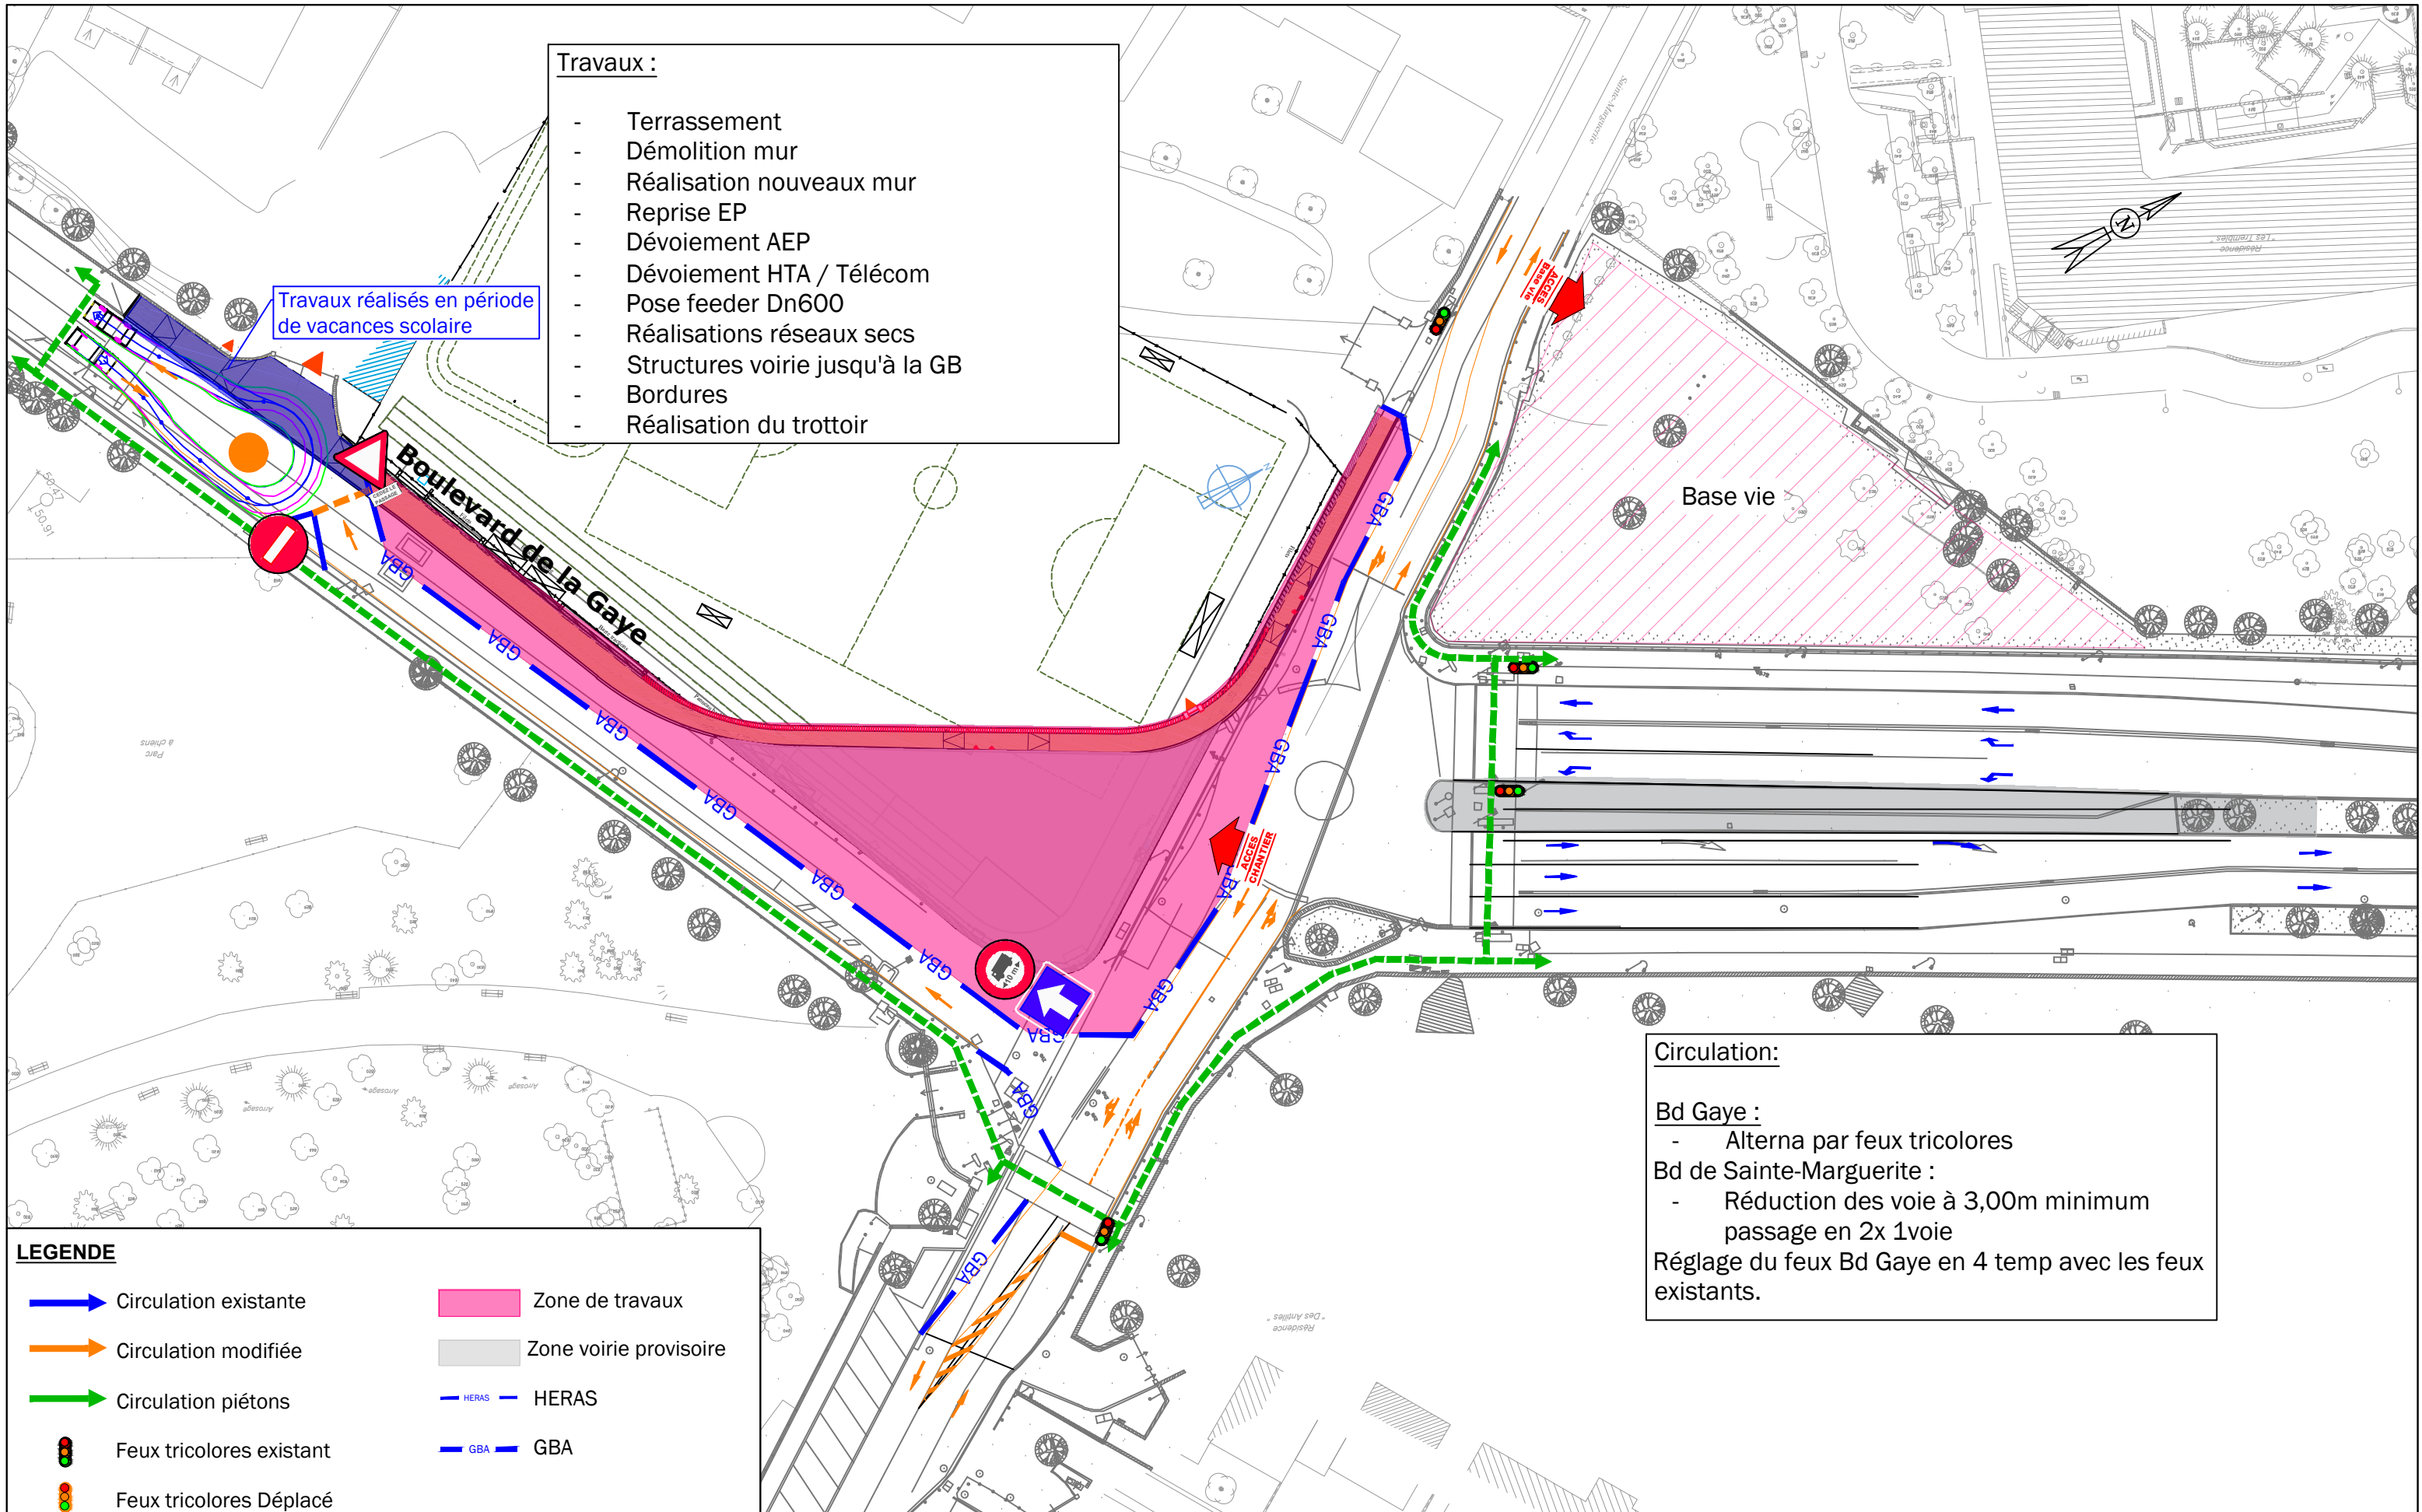

- Circulation:**
- Bd Gaye :**
- Alterna par feux tricolores
- Bd de Sainte-Marguerite :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie
- Réglage du feu Bd Gaye en 4 temp avec les feux existants.

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)

PHASE 1


Démolition et construction mur

Date:

Indice:

Travaux :

- Démolition îlot central
- Réalisation voirie provisoire

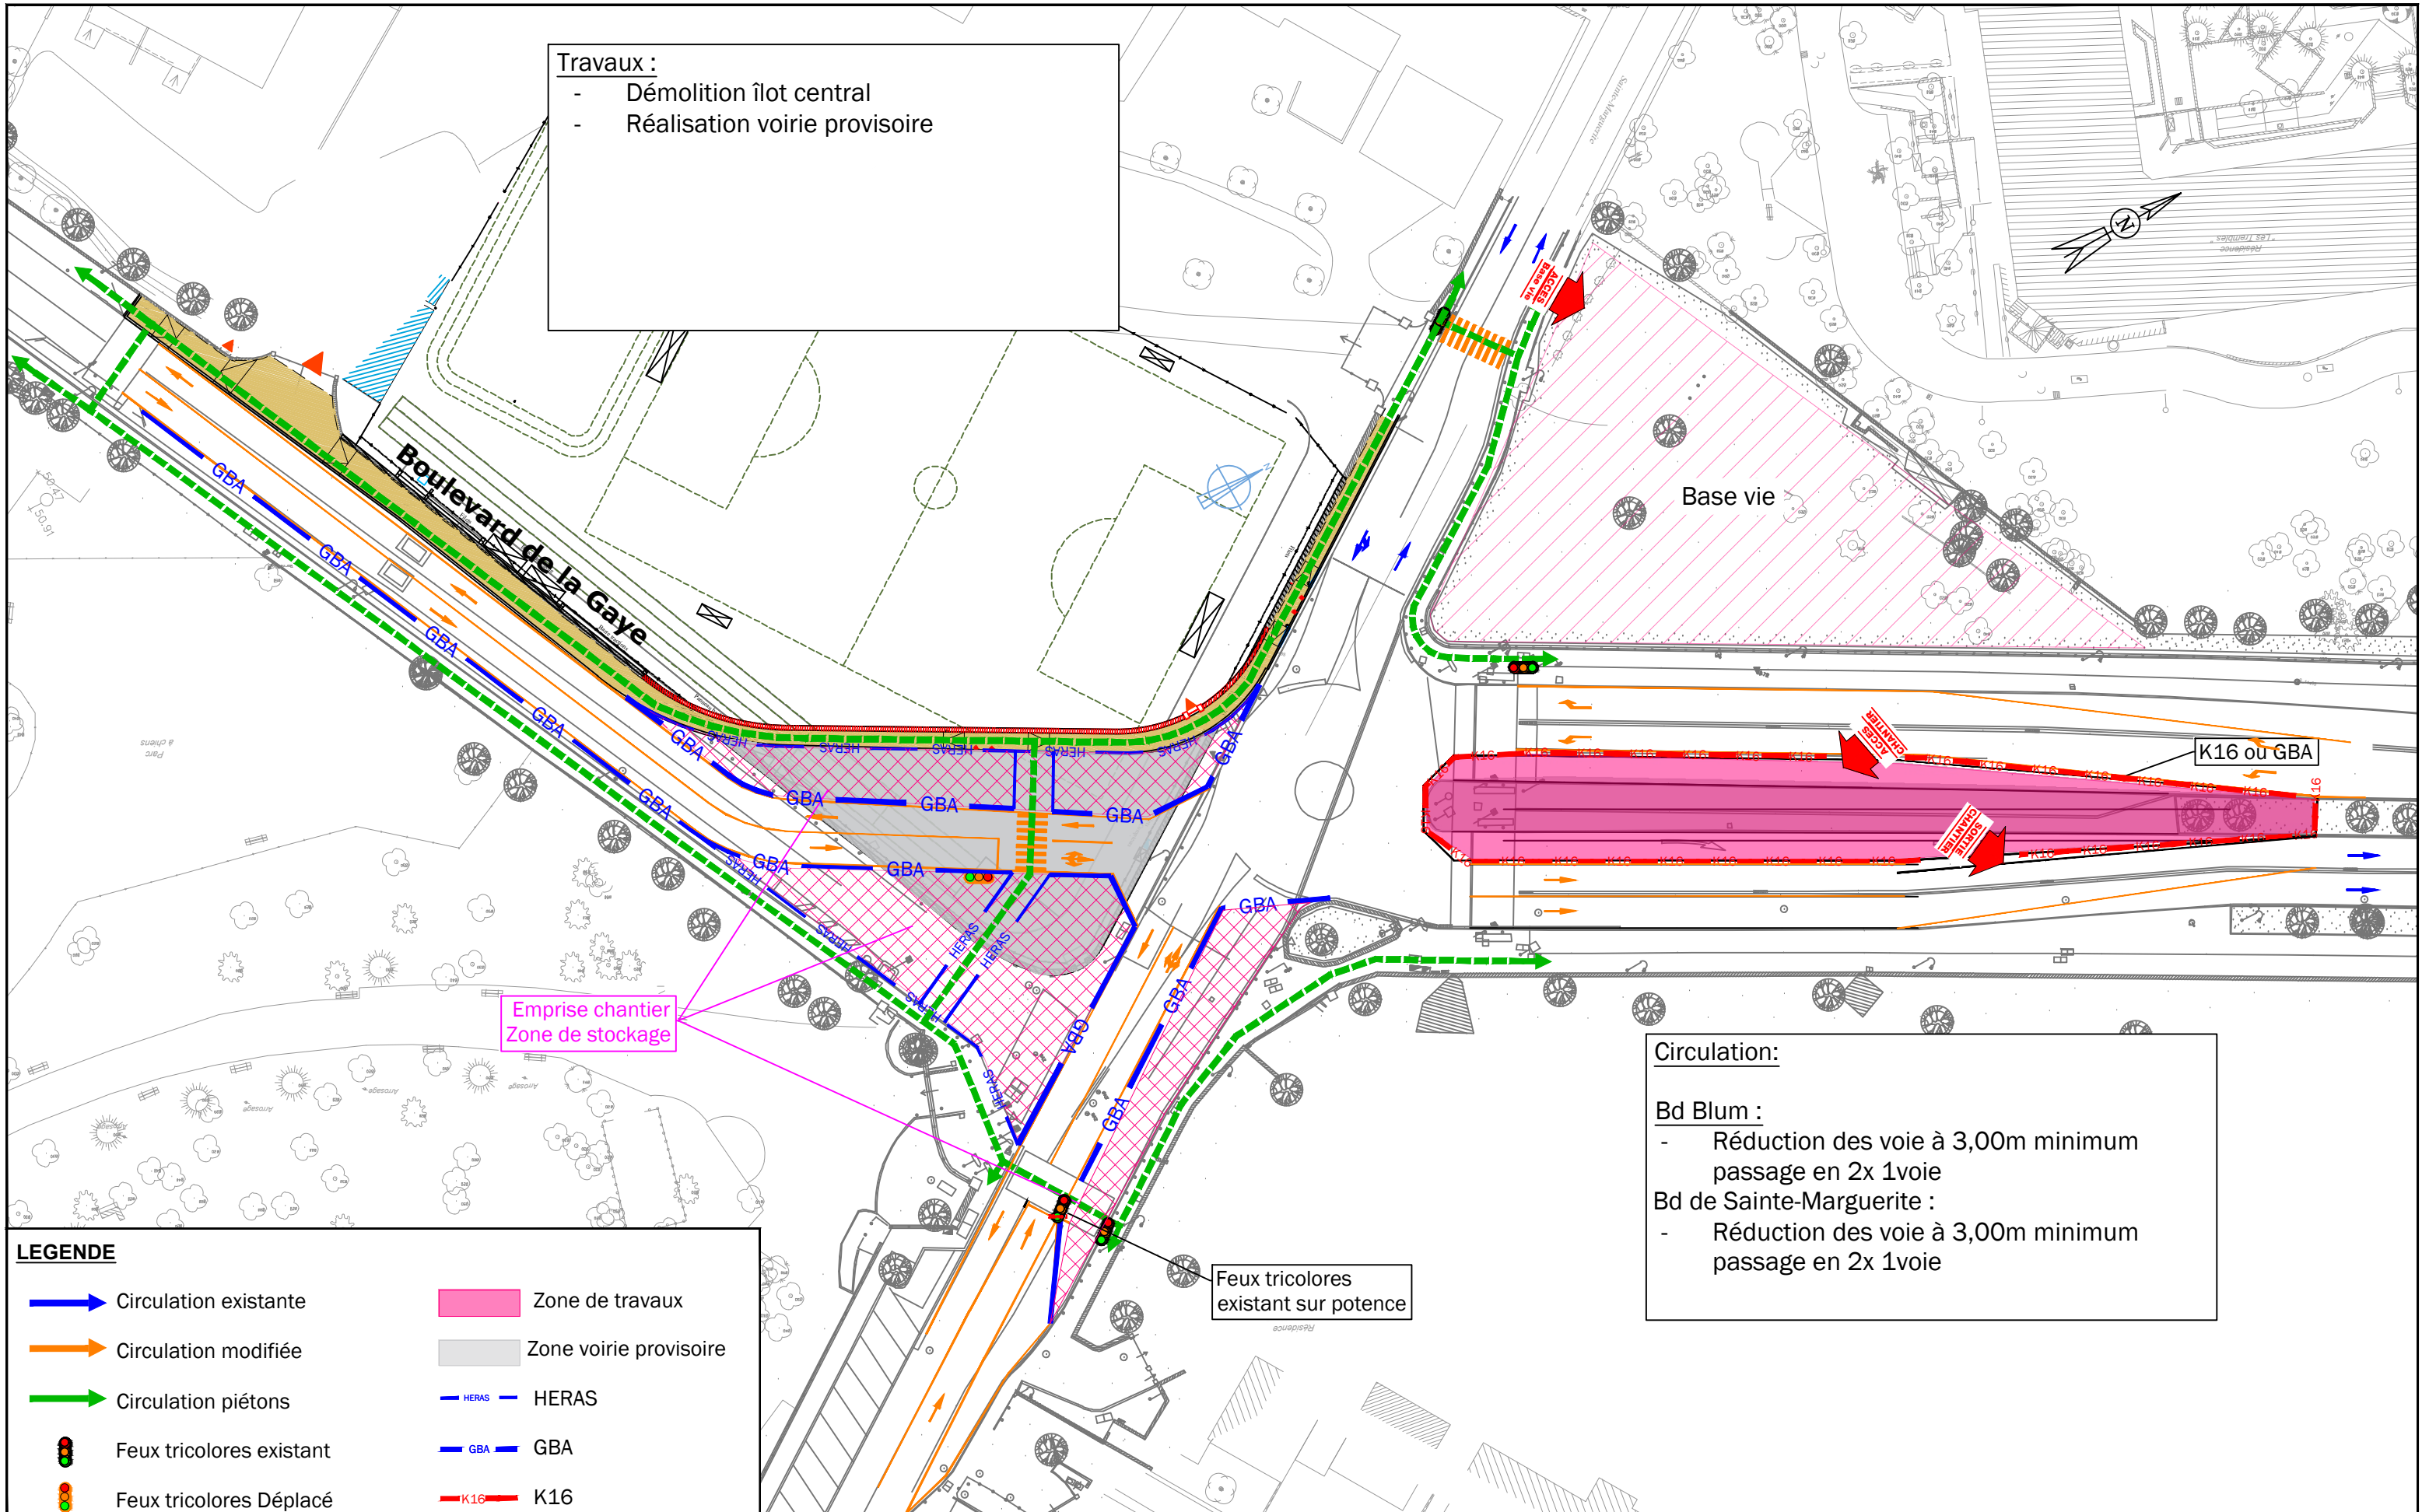

Emprise chantier
Zone de stockage

Circulation:

Bd Blum :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie

Bd de Sainte-Marguerite :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		K16

spie batignolles
malet
spie batignolles
travaux publics

AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)


PHASE 2

Démolition îlot central Création voirie provisoire

Date:

Indice:

- Travaux :**
- Démolition trottoir existant
 - Terrassement
 - Réalisation réseau EP
 - Réalisation feeder AEP
 - Dévoiement HTA / Télécom
 - Réalisations réseaux secs
 - Structures voirie jusqu'à la GB
 - Bordures
 - Réalisation du trottoir

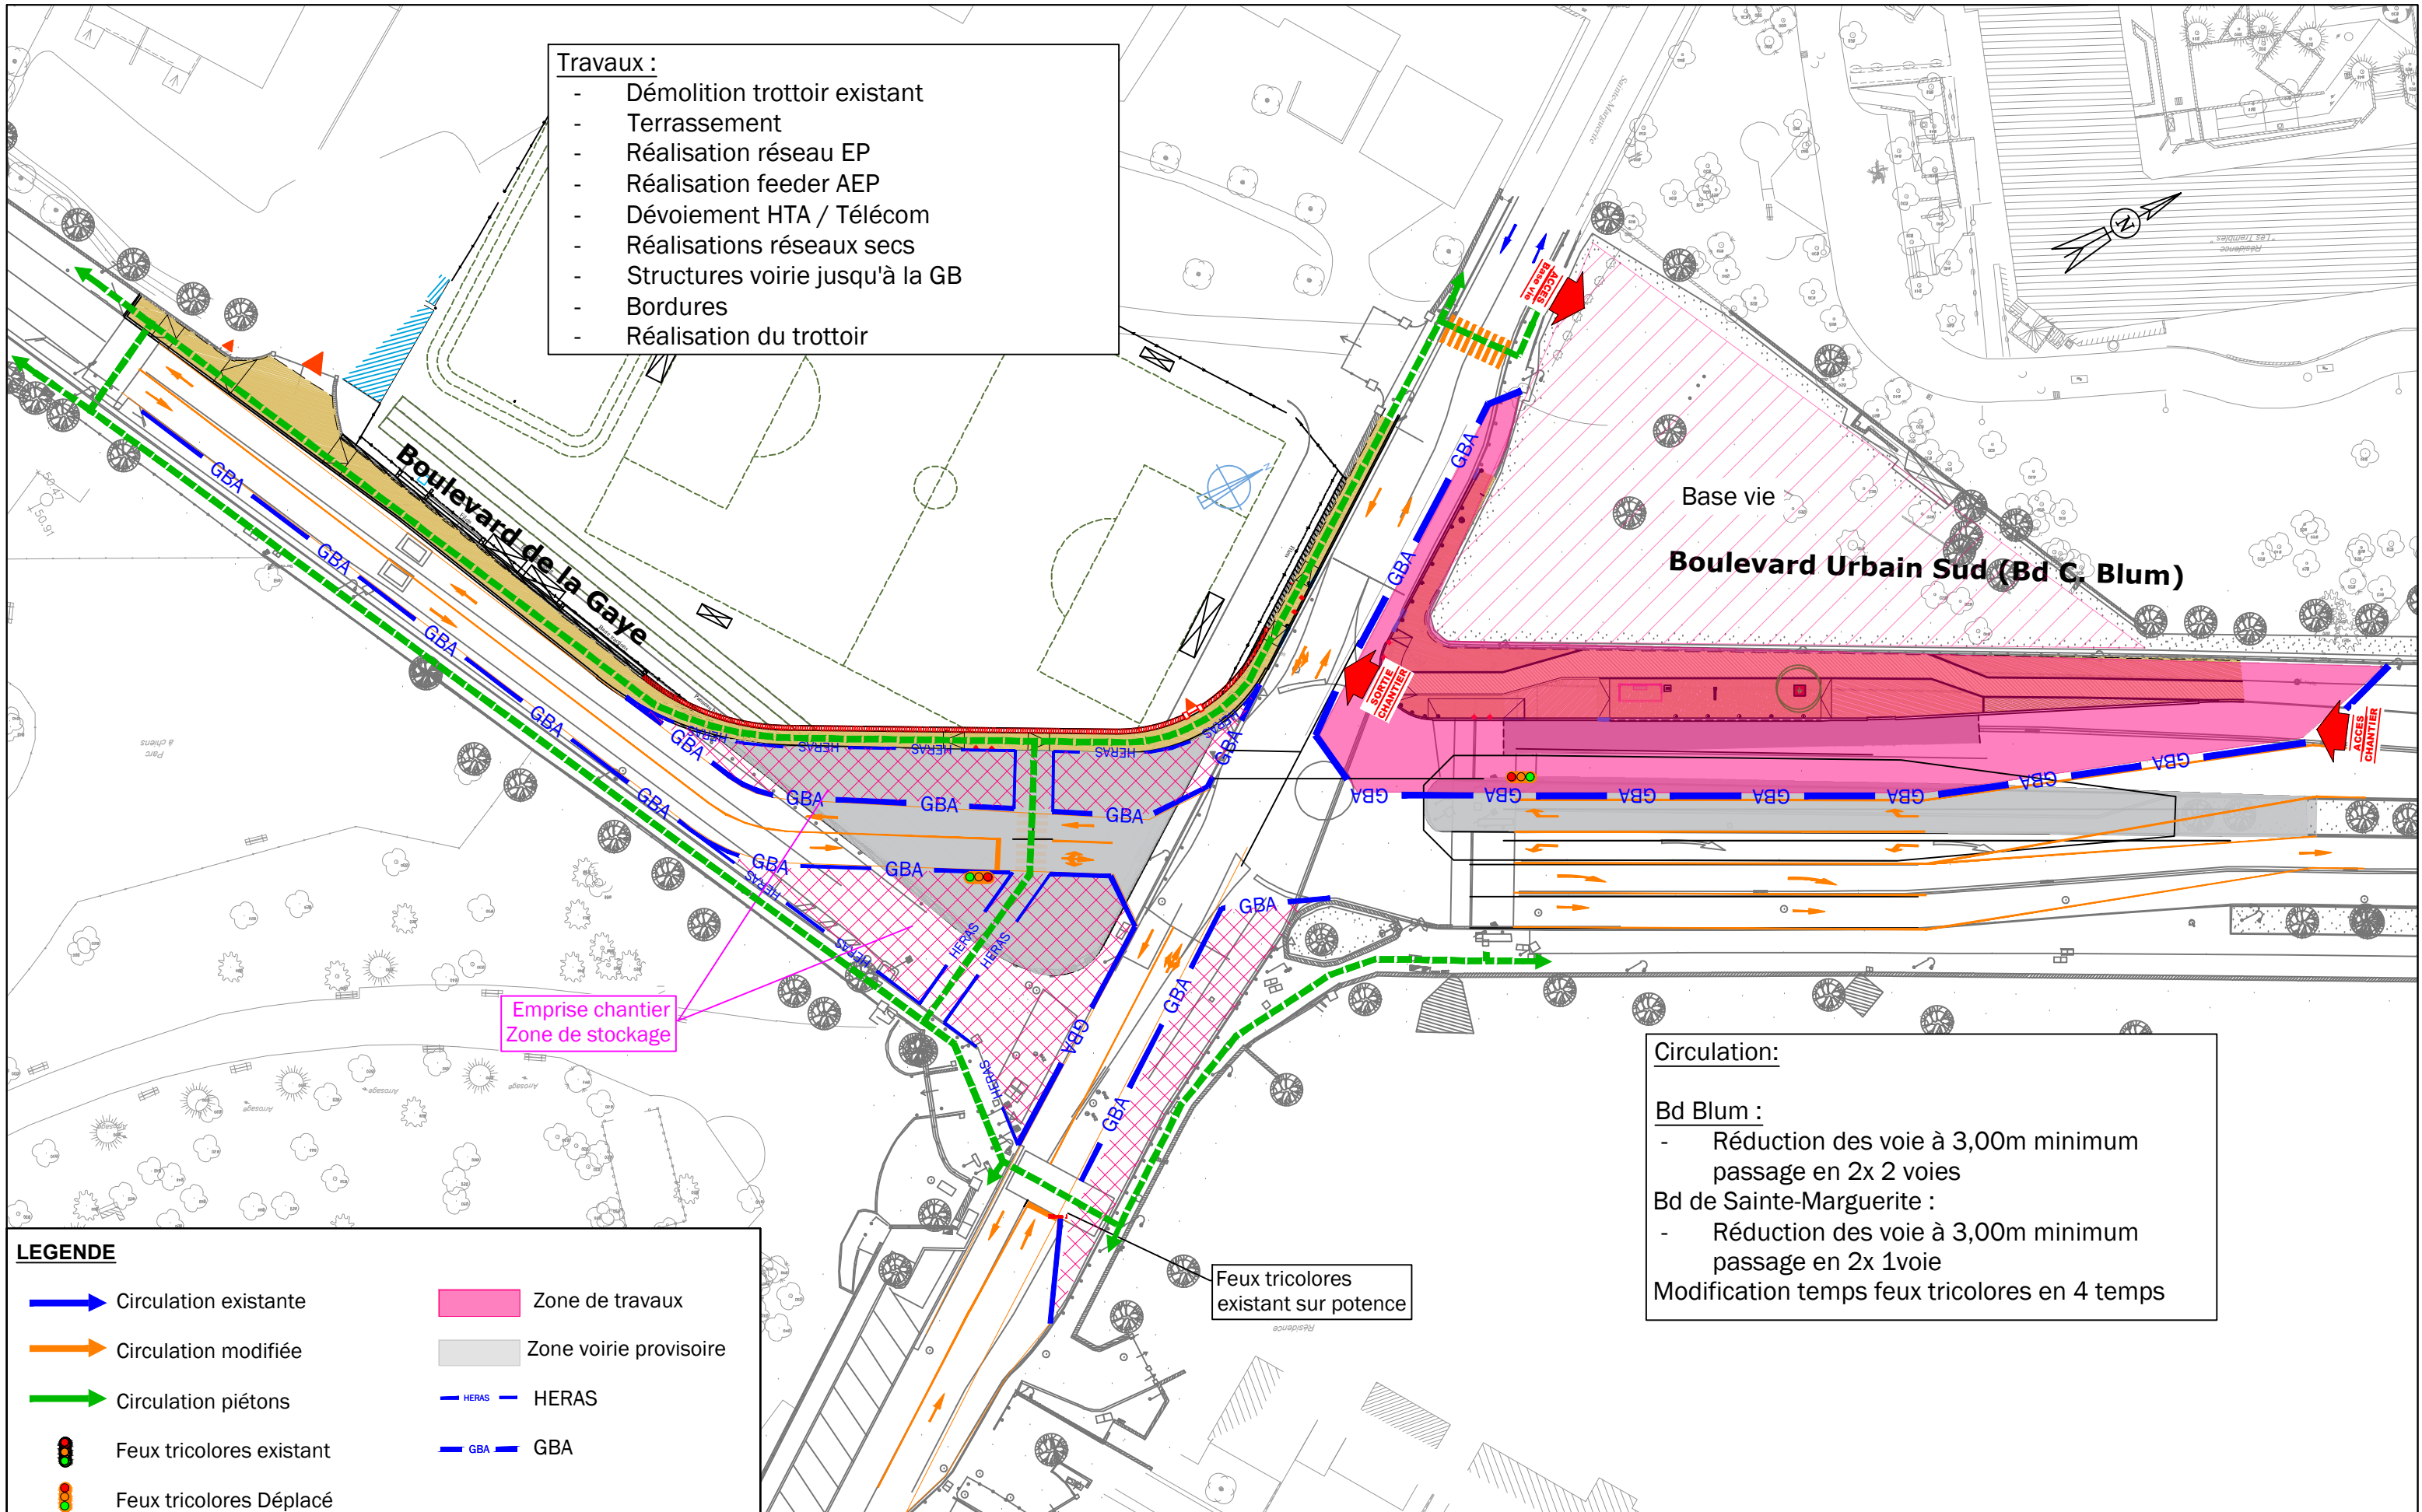

Emprise chantier
Zone de stockage

- Circulation:**
- Bd Blum :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 2 voies
- Bd de Sainte-Marguerite :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie
- Modification temps feux tricolores en 4 temps

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)


PHASE 3

Création Trottoir Ouest

Date:

Indice:

- Travaux :**
- Terrassement
 - Réalisation réseau EP
 - Réalisation feeder AEP
 - Structures voirie jusqu'à la GB

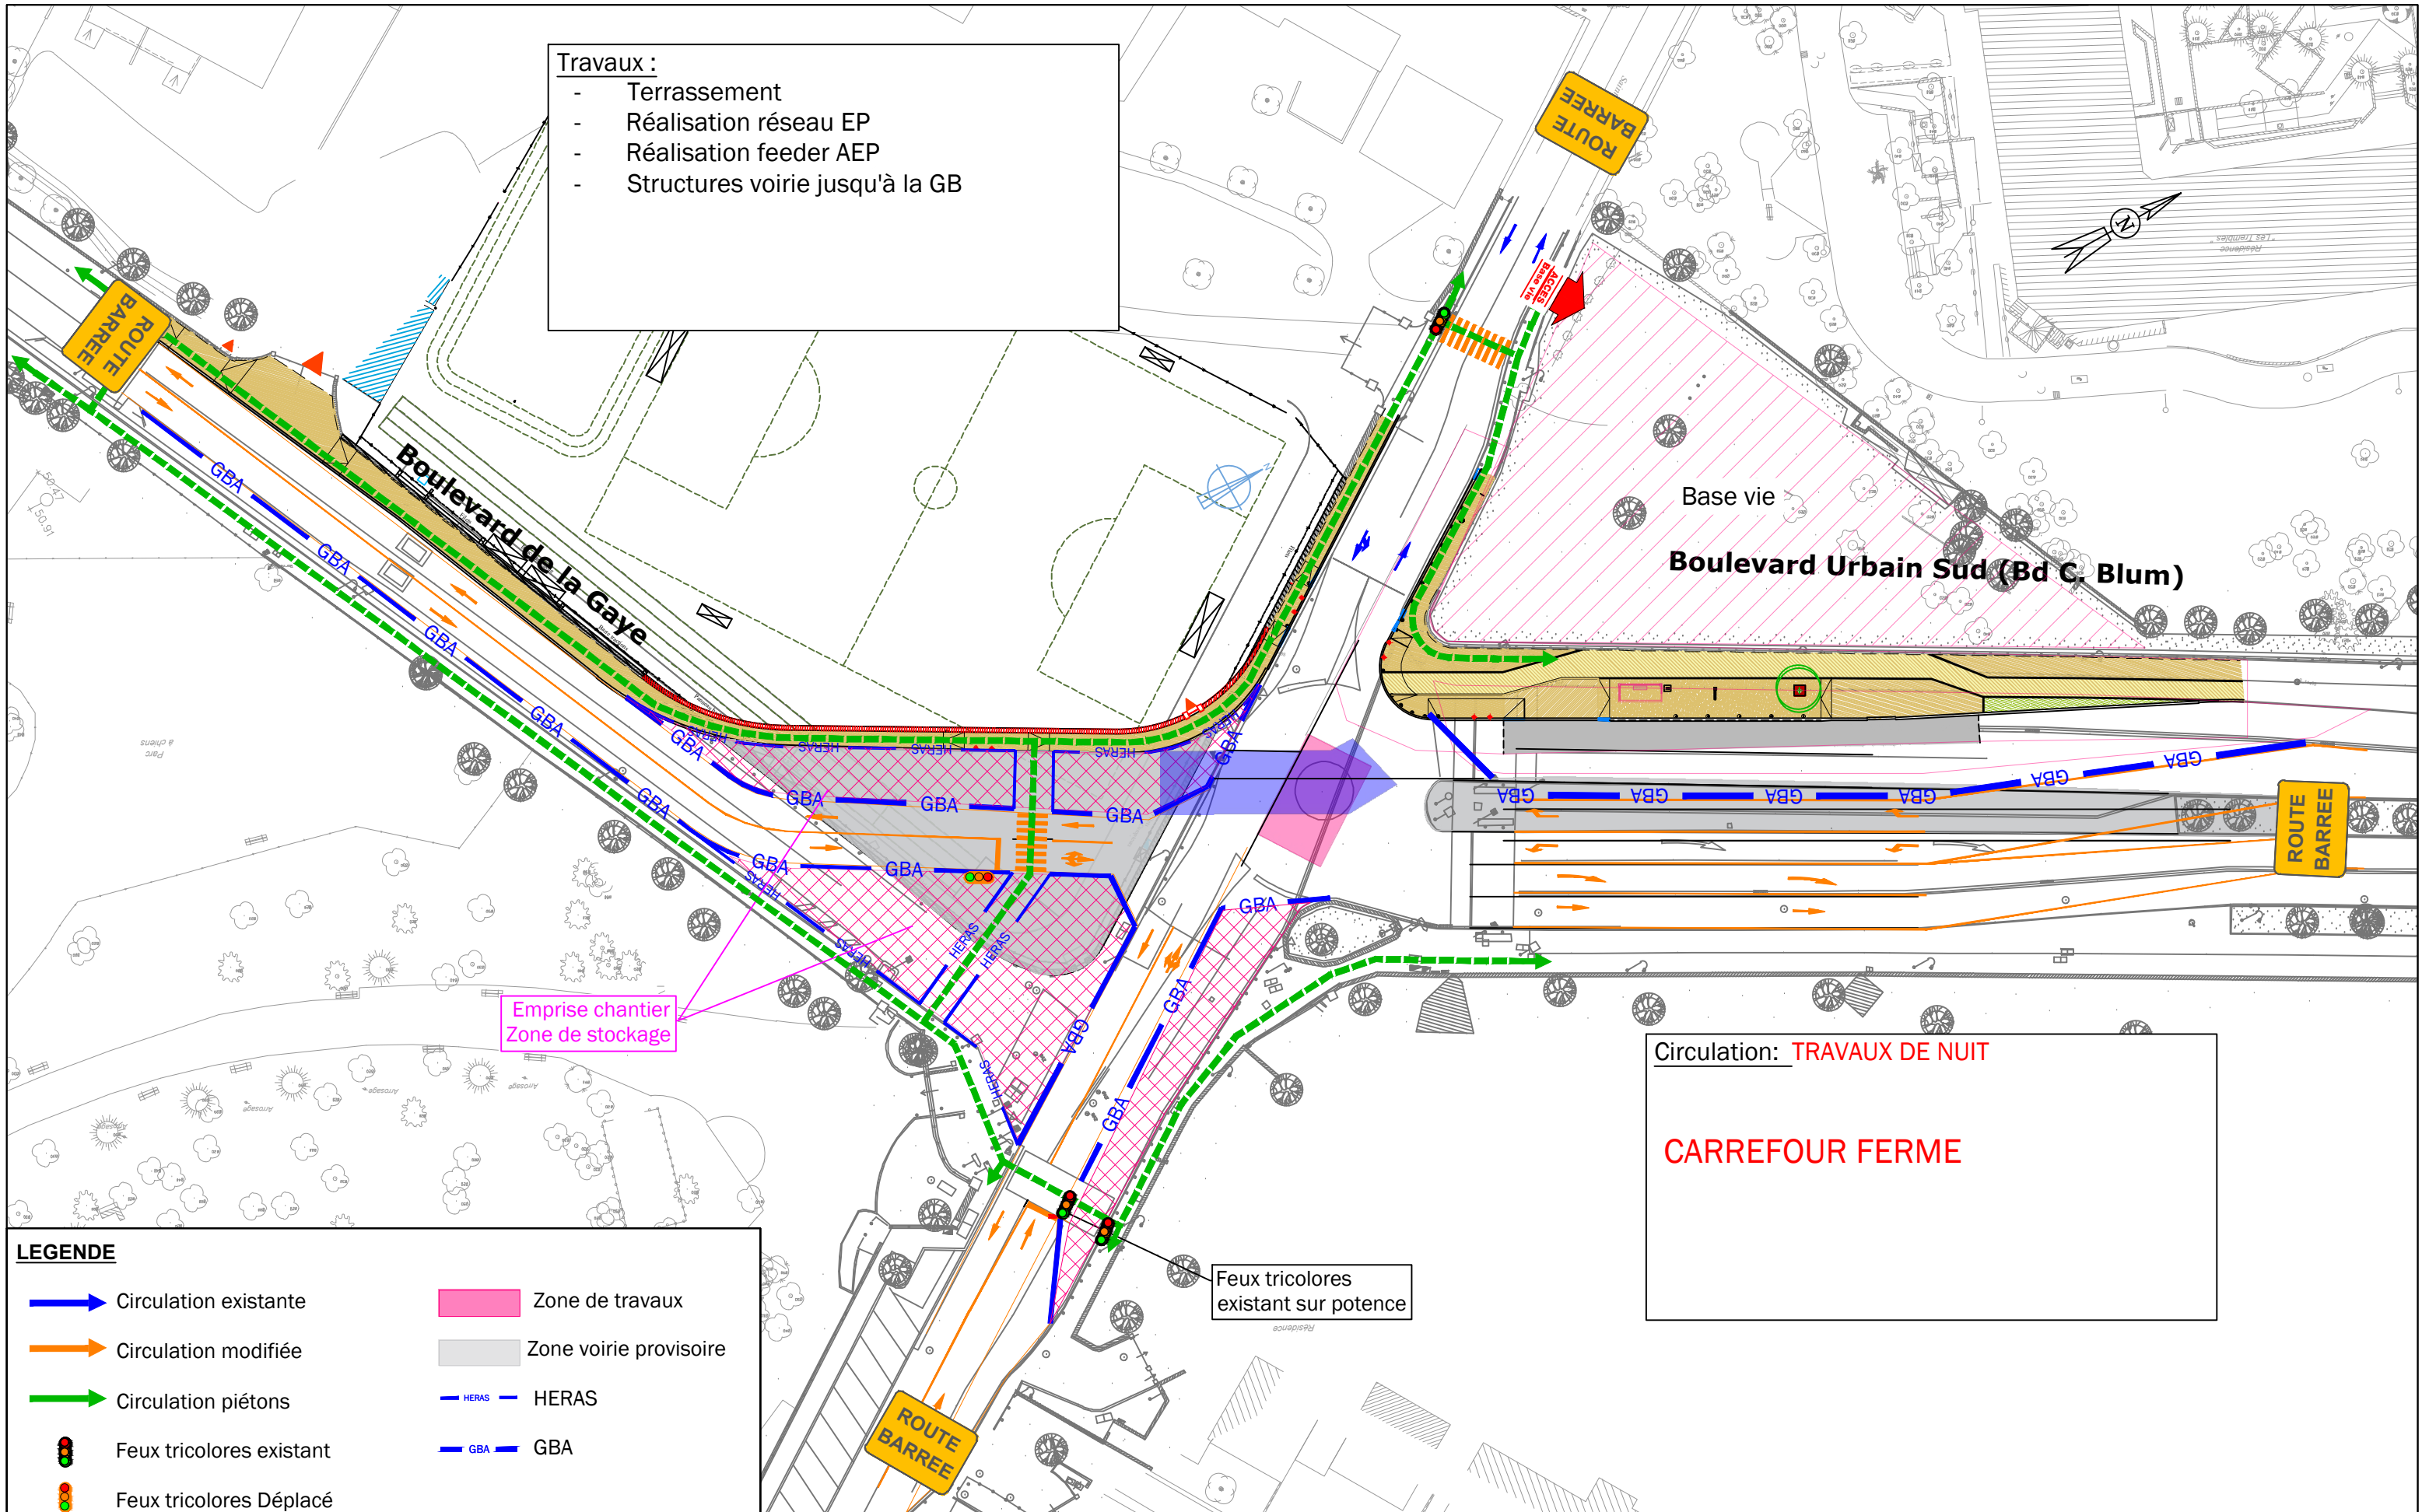


Emprise chantier
Zone de stockage

Circulation: TRAVAUX DE NUIT
CARREFOUR FERME

LEGENDE

Circulation existante	Zone de travaux
Circulation modifiée	Zone voirie provisoire
Circulation piétons	HERAS
Feux tricolores existant	GBA
Feux tricolores Déplacé	


Feux tricolores existant sur potence



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE
Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)

PHASE 4a - TRAVAUX DE NUIT
Réalisation des réseaux - Travaux de nuit

Date: _____
Indice: _____

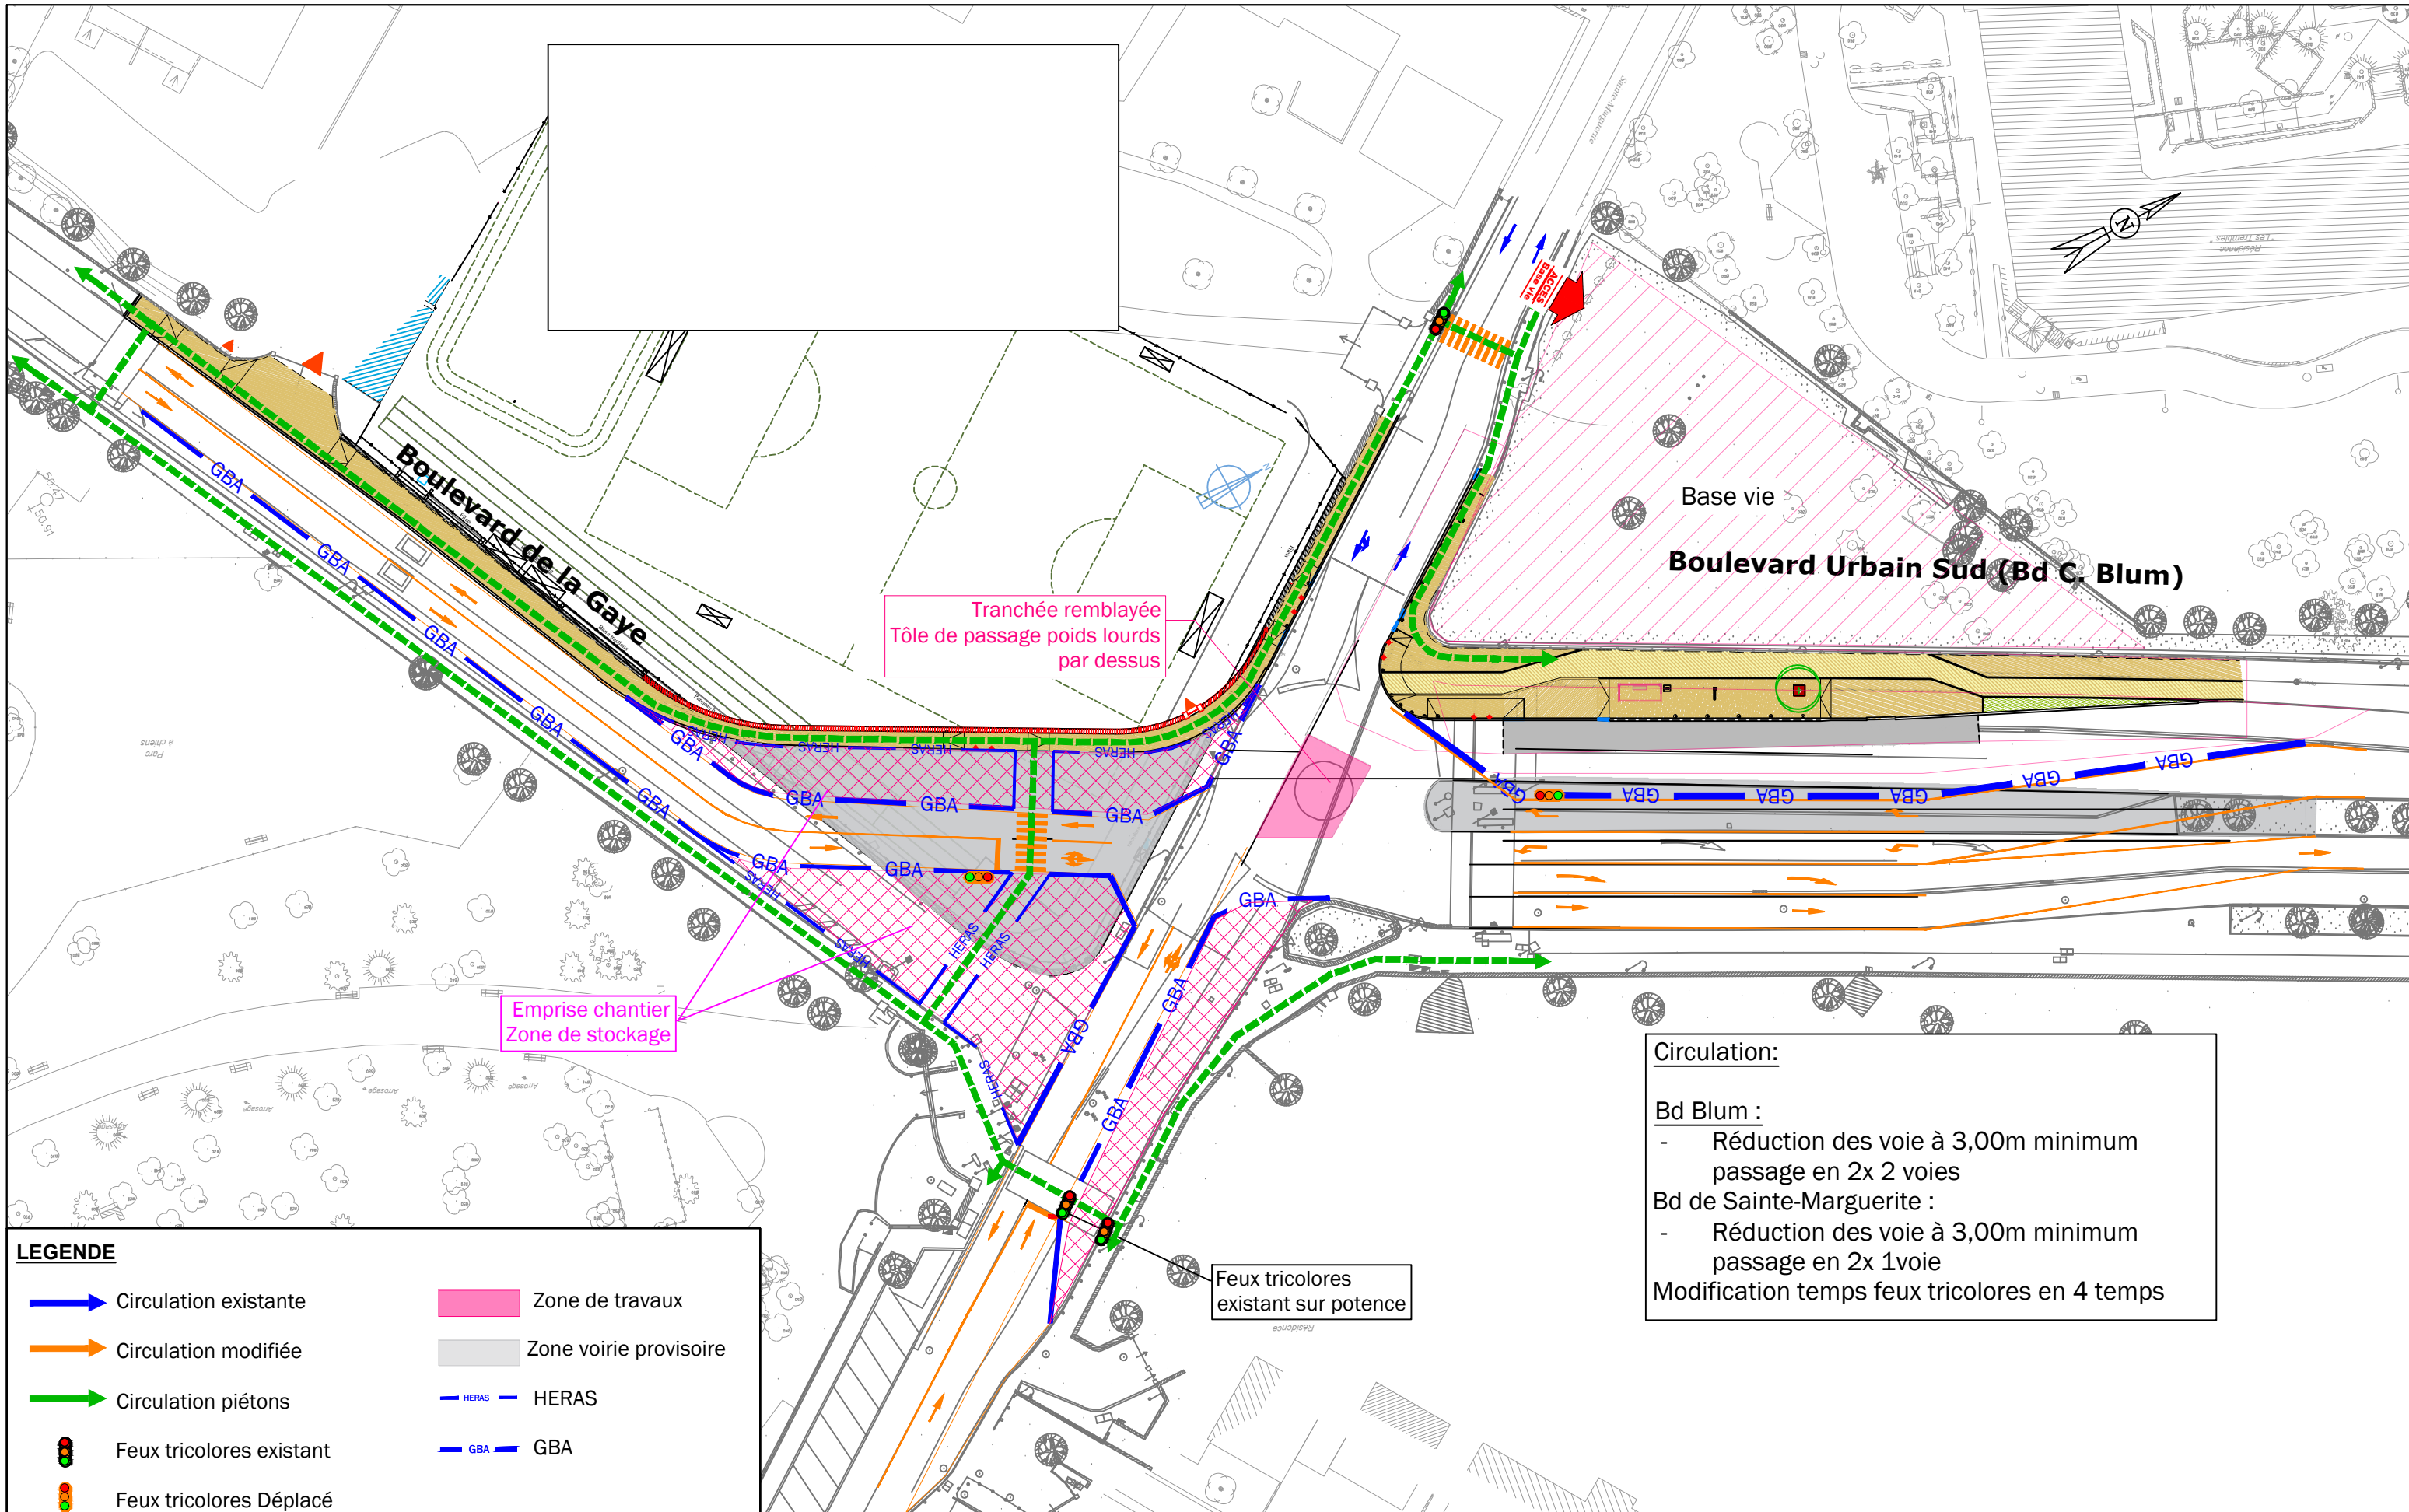

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		

Circulation:

Bd Blum :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 2 voies

Bd de Sainte-Marguerite :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie

Modification temps feux tricolores en 4 temps



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)


PHASE 4b - CIRCULATION DE JOUR

Réalisation des réseaux - Travaux de nuit

Date:

Indice:

- Travaux :**
- Démolition trottoir existant
 - Terrassement
 - Réalisation réseau EP
 - Dévoiement HTA / Télécom
 - Réalisations réseaux secs
 - Structures voirie jusqu'à la GB
 - Bordures
 - Réalisation du trottoir

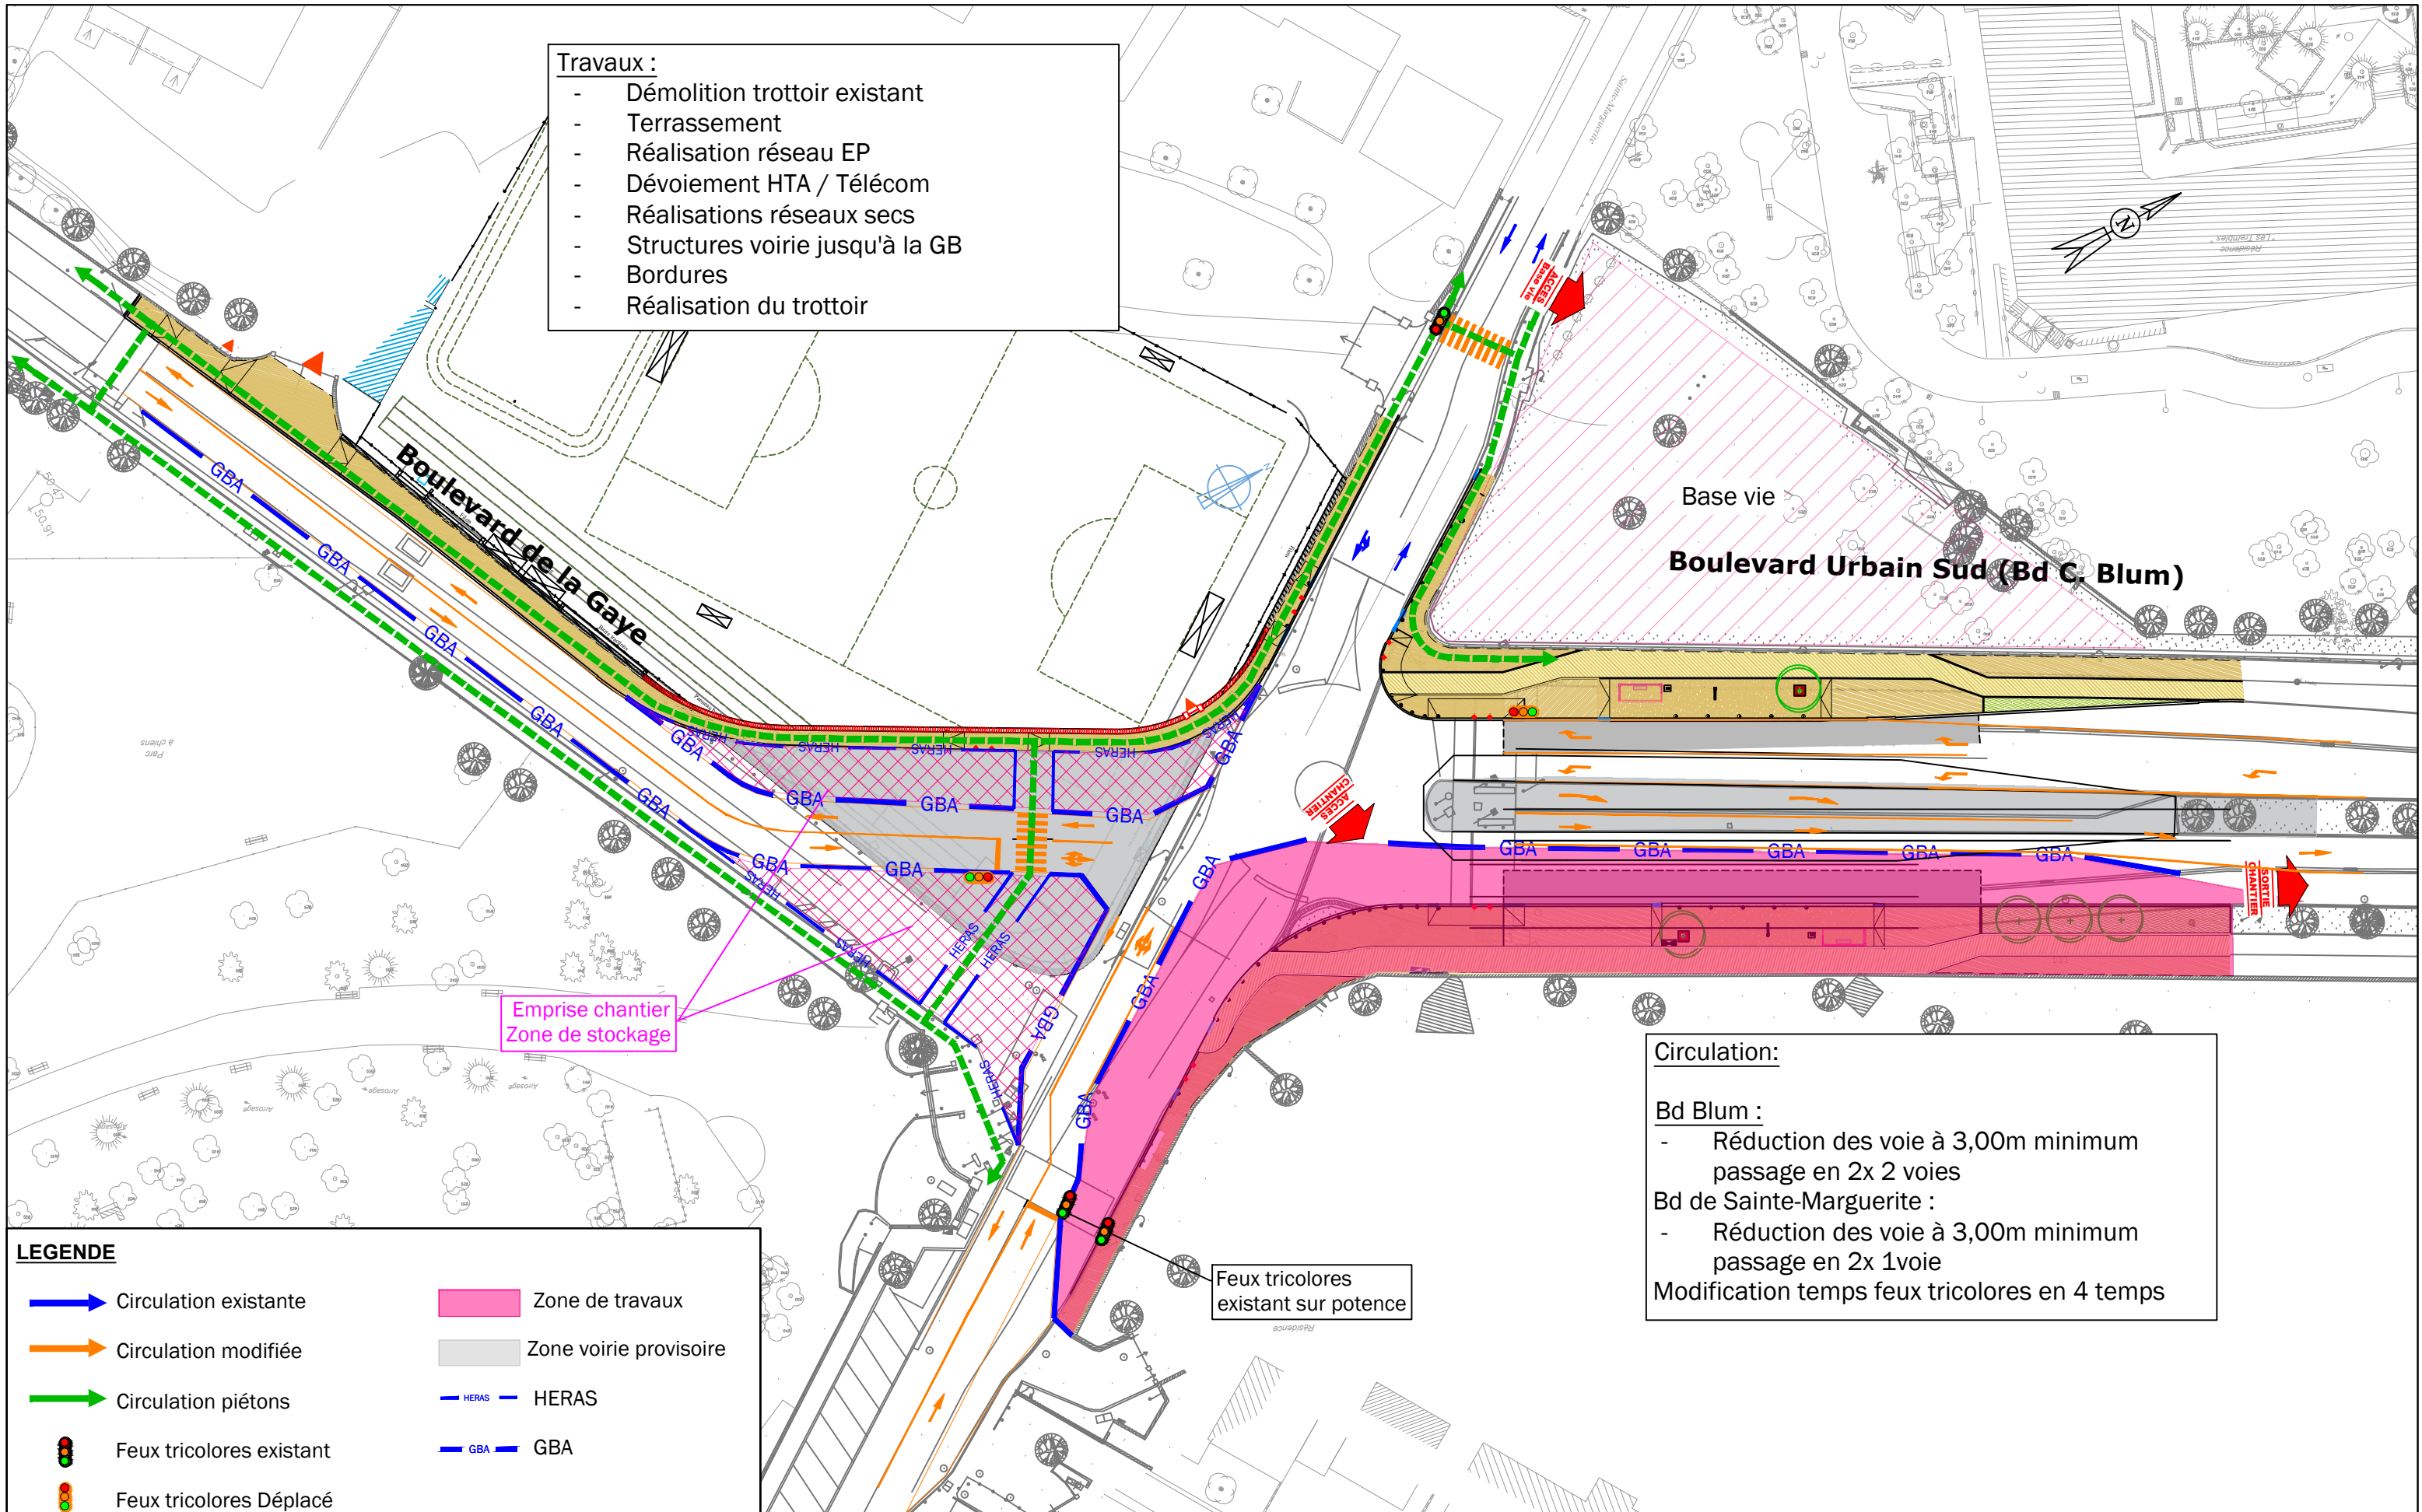

Emprise chantier
Zone de stockage

- Circulation:**
- Bd Blum :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 2 voies
- Bd de Sainte-Marguerite :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie
- Modification temps feux tricolores en 4 temps

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		

AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)


PHASE 5

Création trottoir Est

Date:

Indice:


- Travaux :**
- Démolition trottoir existant
 - Terrassement
 - Réalisation réseau EP
 - Réalisations réseaux secs
 - Structures voirie jusqu'à la GB
 - Bordures
 - Réalisation du trottoir

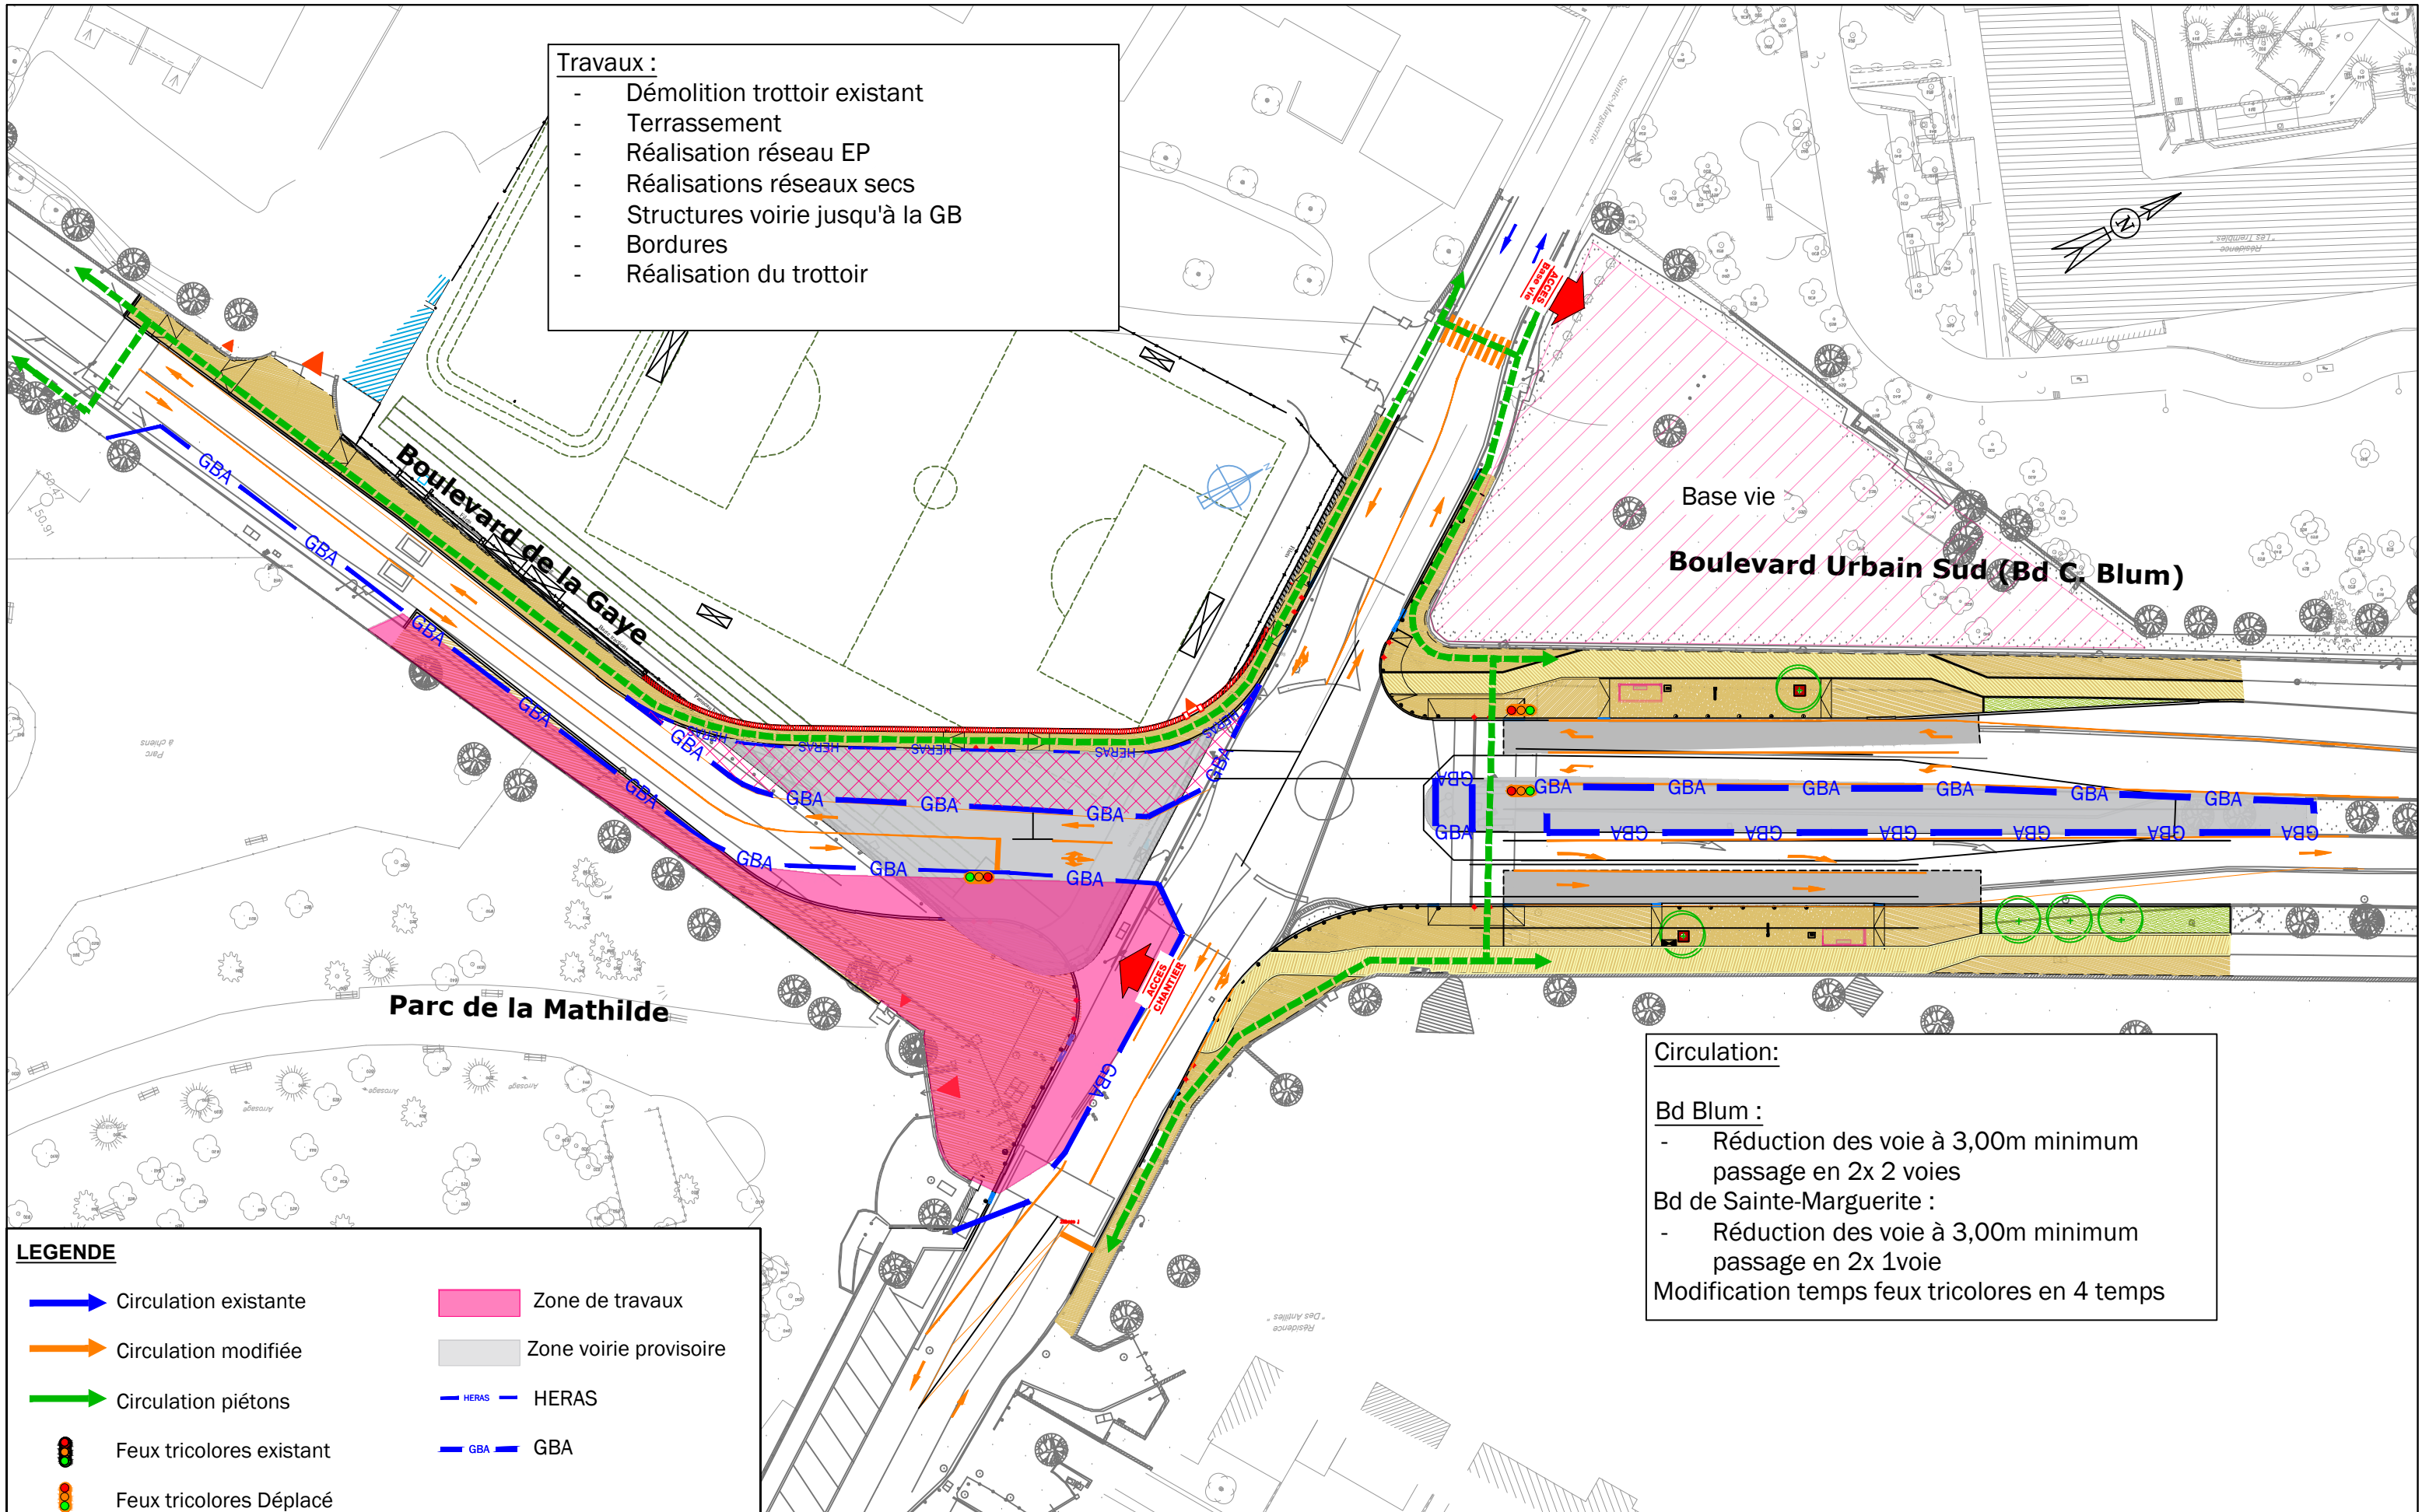

- Circulation:**
- Bd Blum :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 2 voies
- Bd de Sainte-Marguerite :**
- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1voie
- Modification temps feux tricolores en 4 temps

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		GBA
	Feux tricolores Déplacé		



AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE


Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)

PHASE 6

Création Trottoir Jardin Mathilde

Date:

Indice:

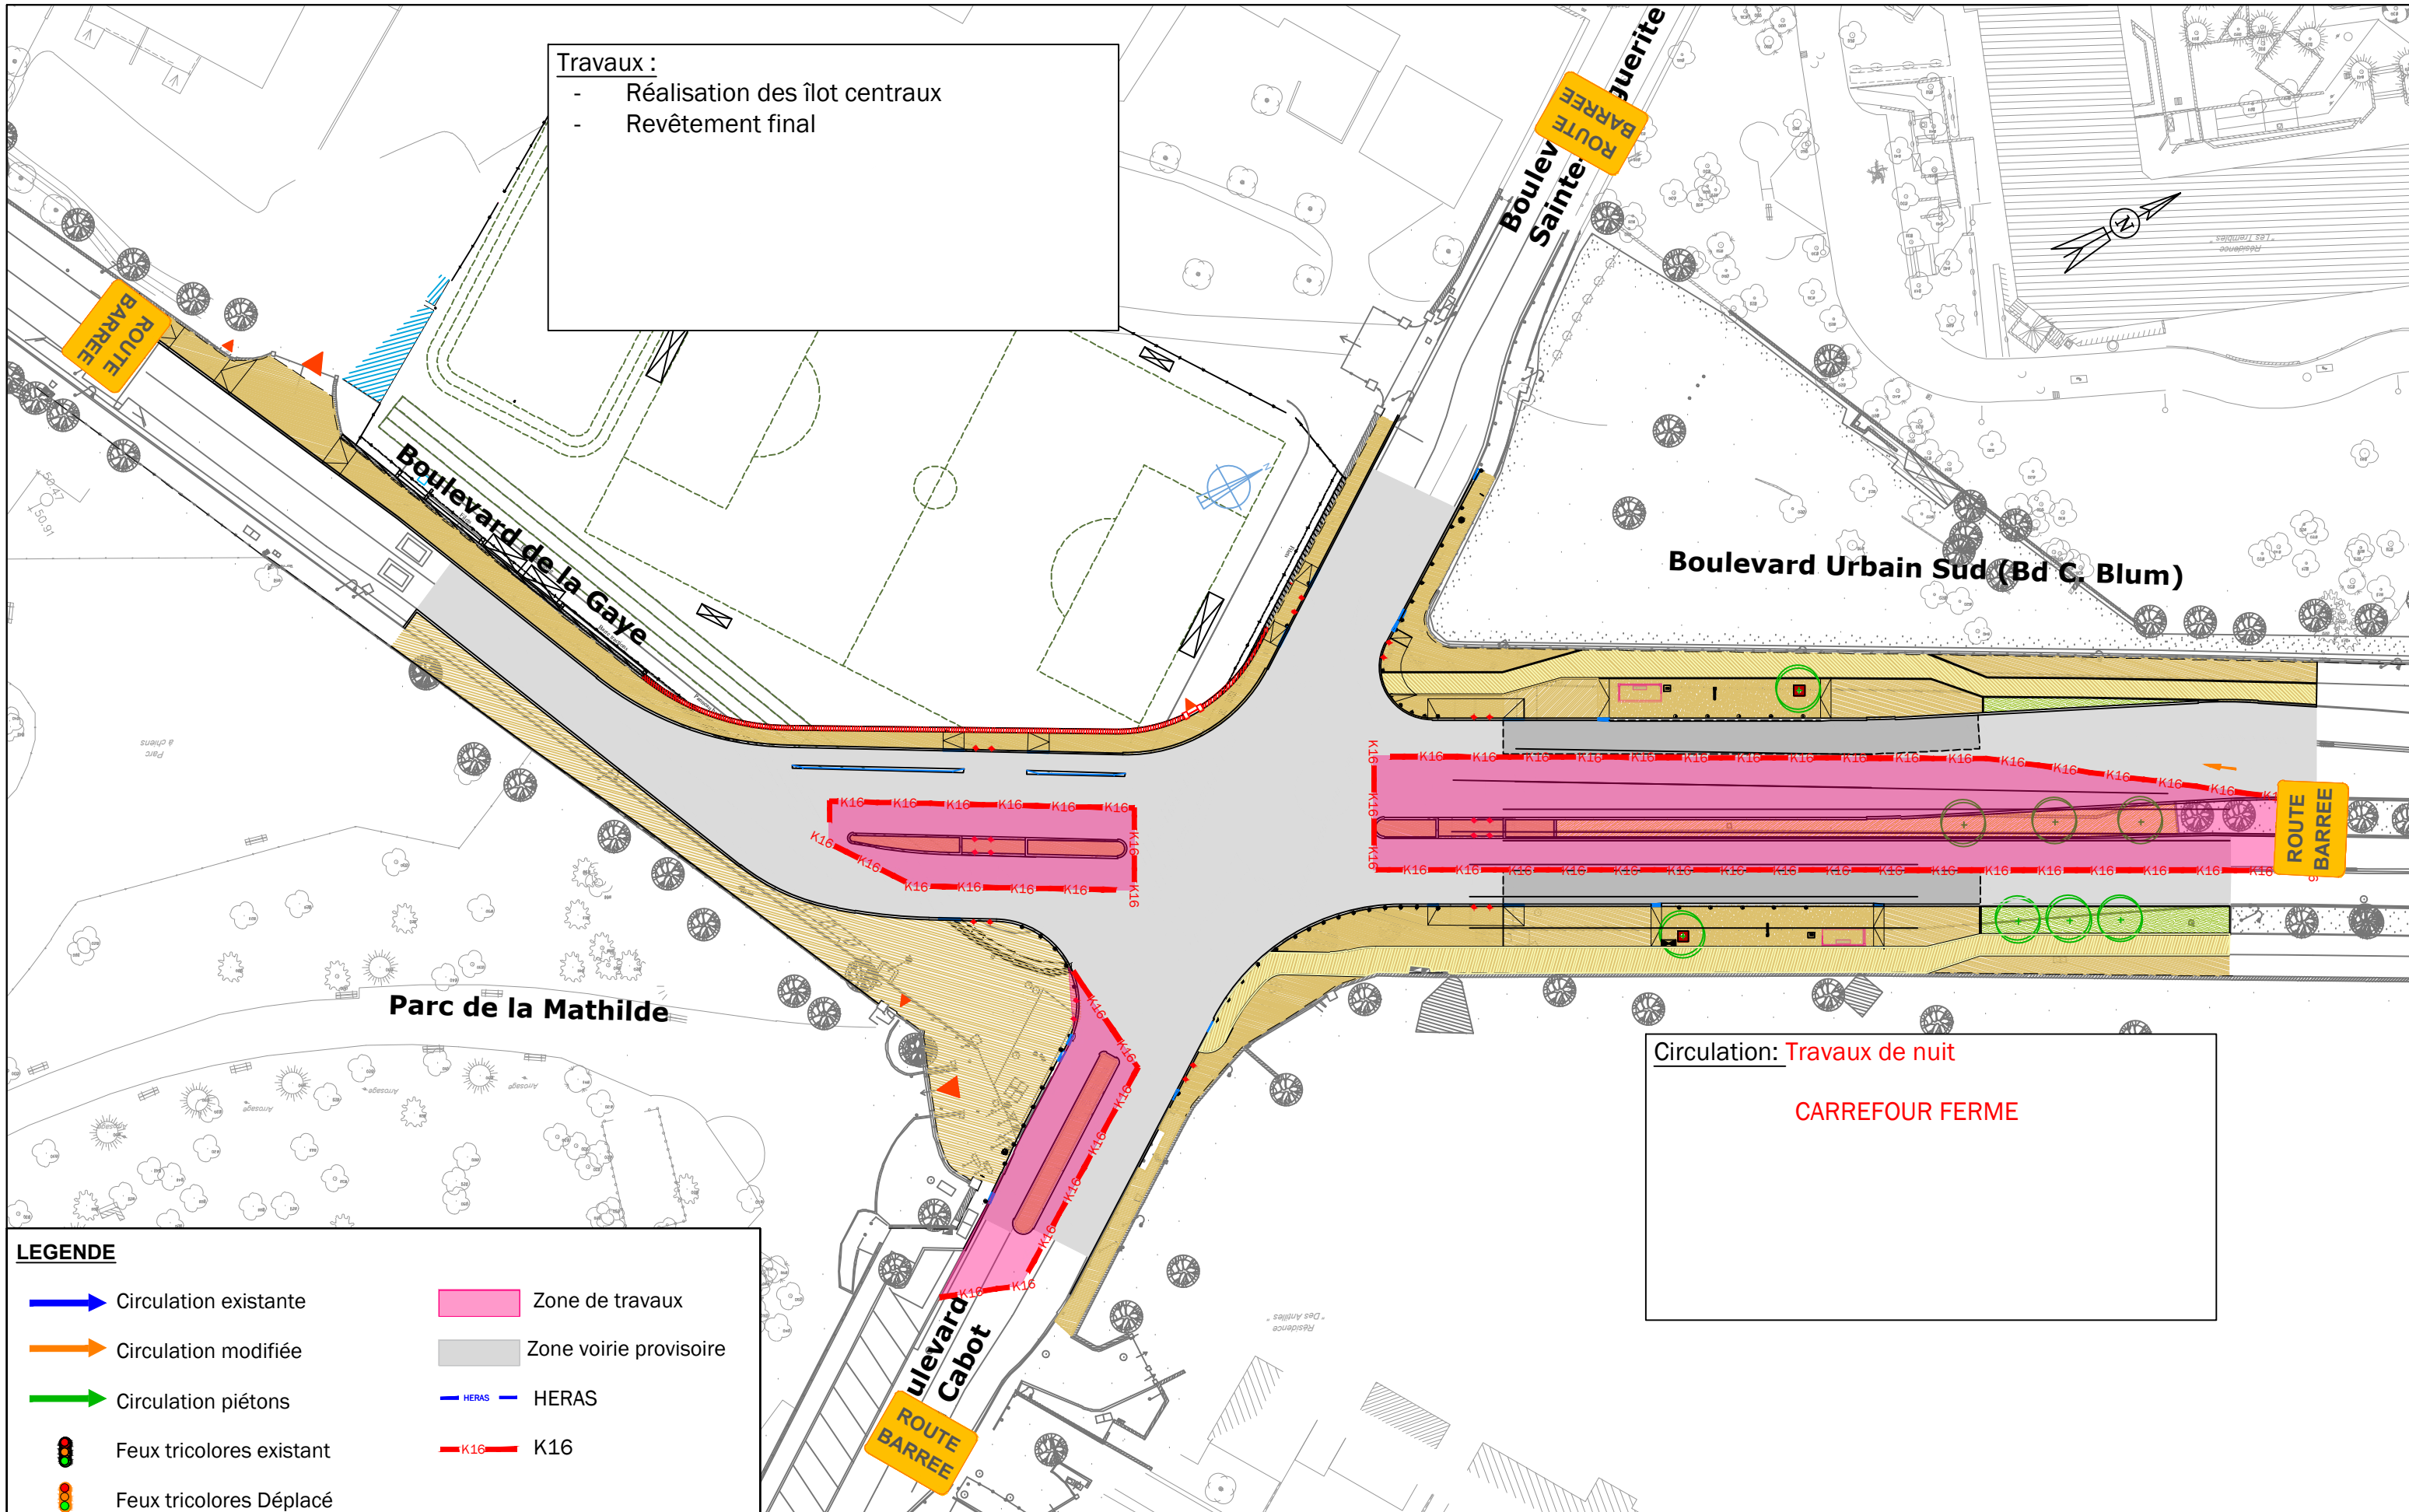

Travaux :

- Réalisation des îlot centraux
- Revêtement final


Circulation: **Travaux de nuit**

CARREFOUR FERME

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		K16
	Feux tricolores Déplacé		

	<h2>AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE</h2> <p>Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)</p>	<h2>PHASE 7a - TRAVAUX DE NUIT</h2> <h3>Revêtements et îlots centraux - Travaux de nuit</h3>	Date:
			Indice:

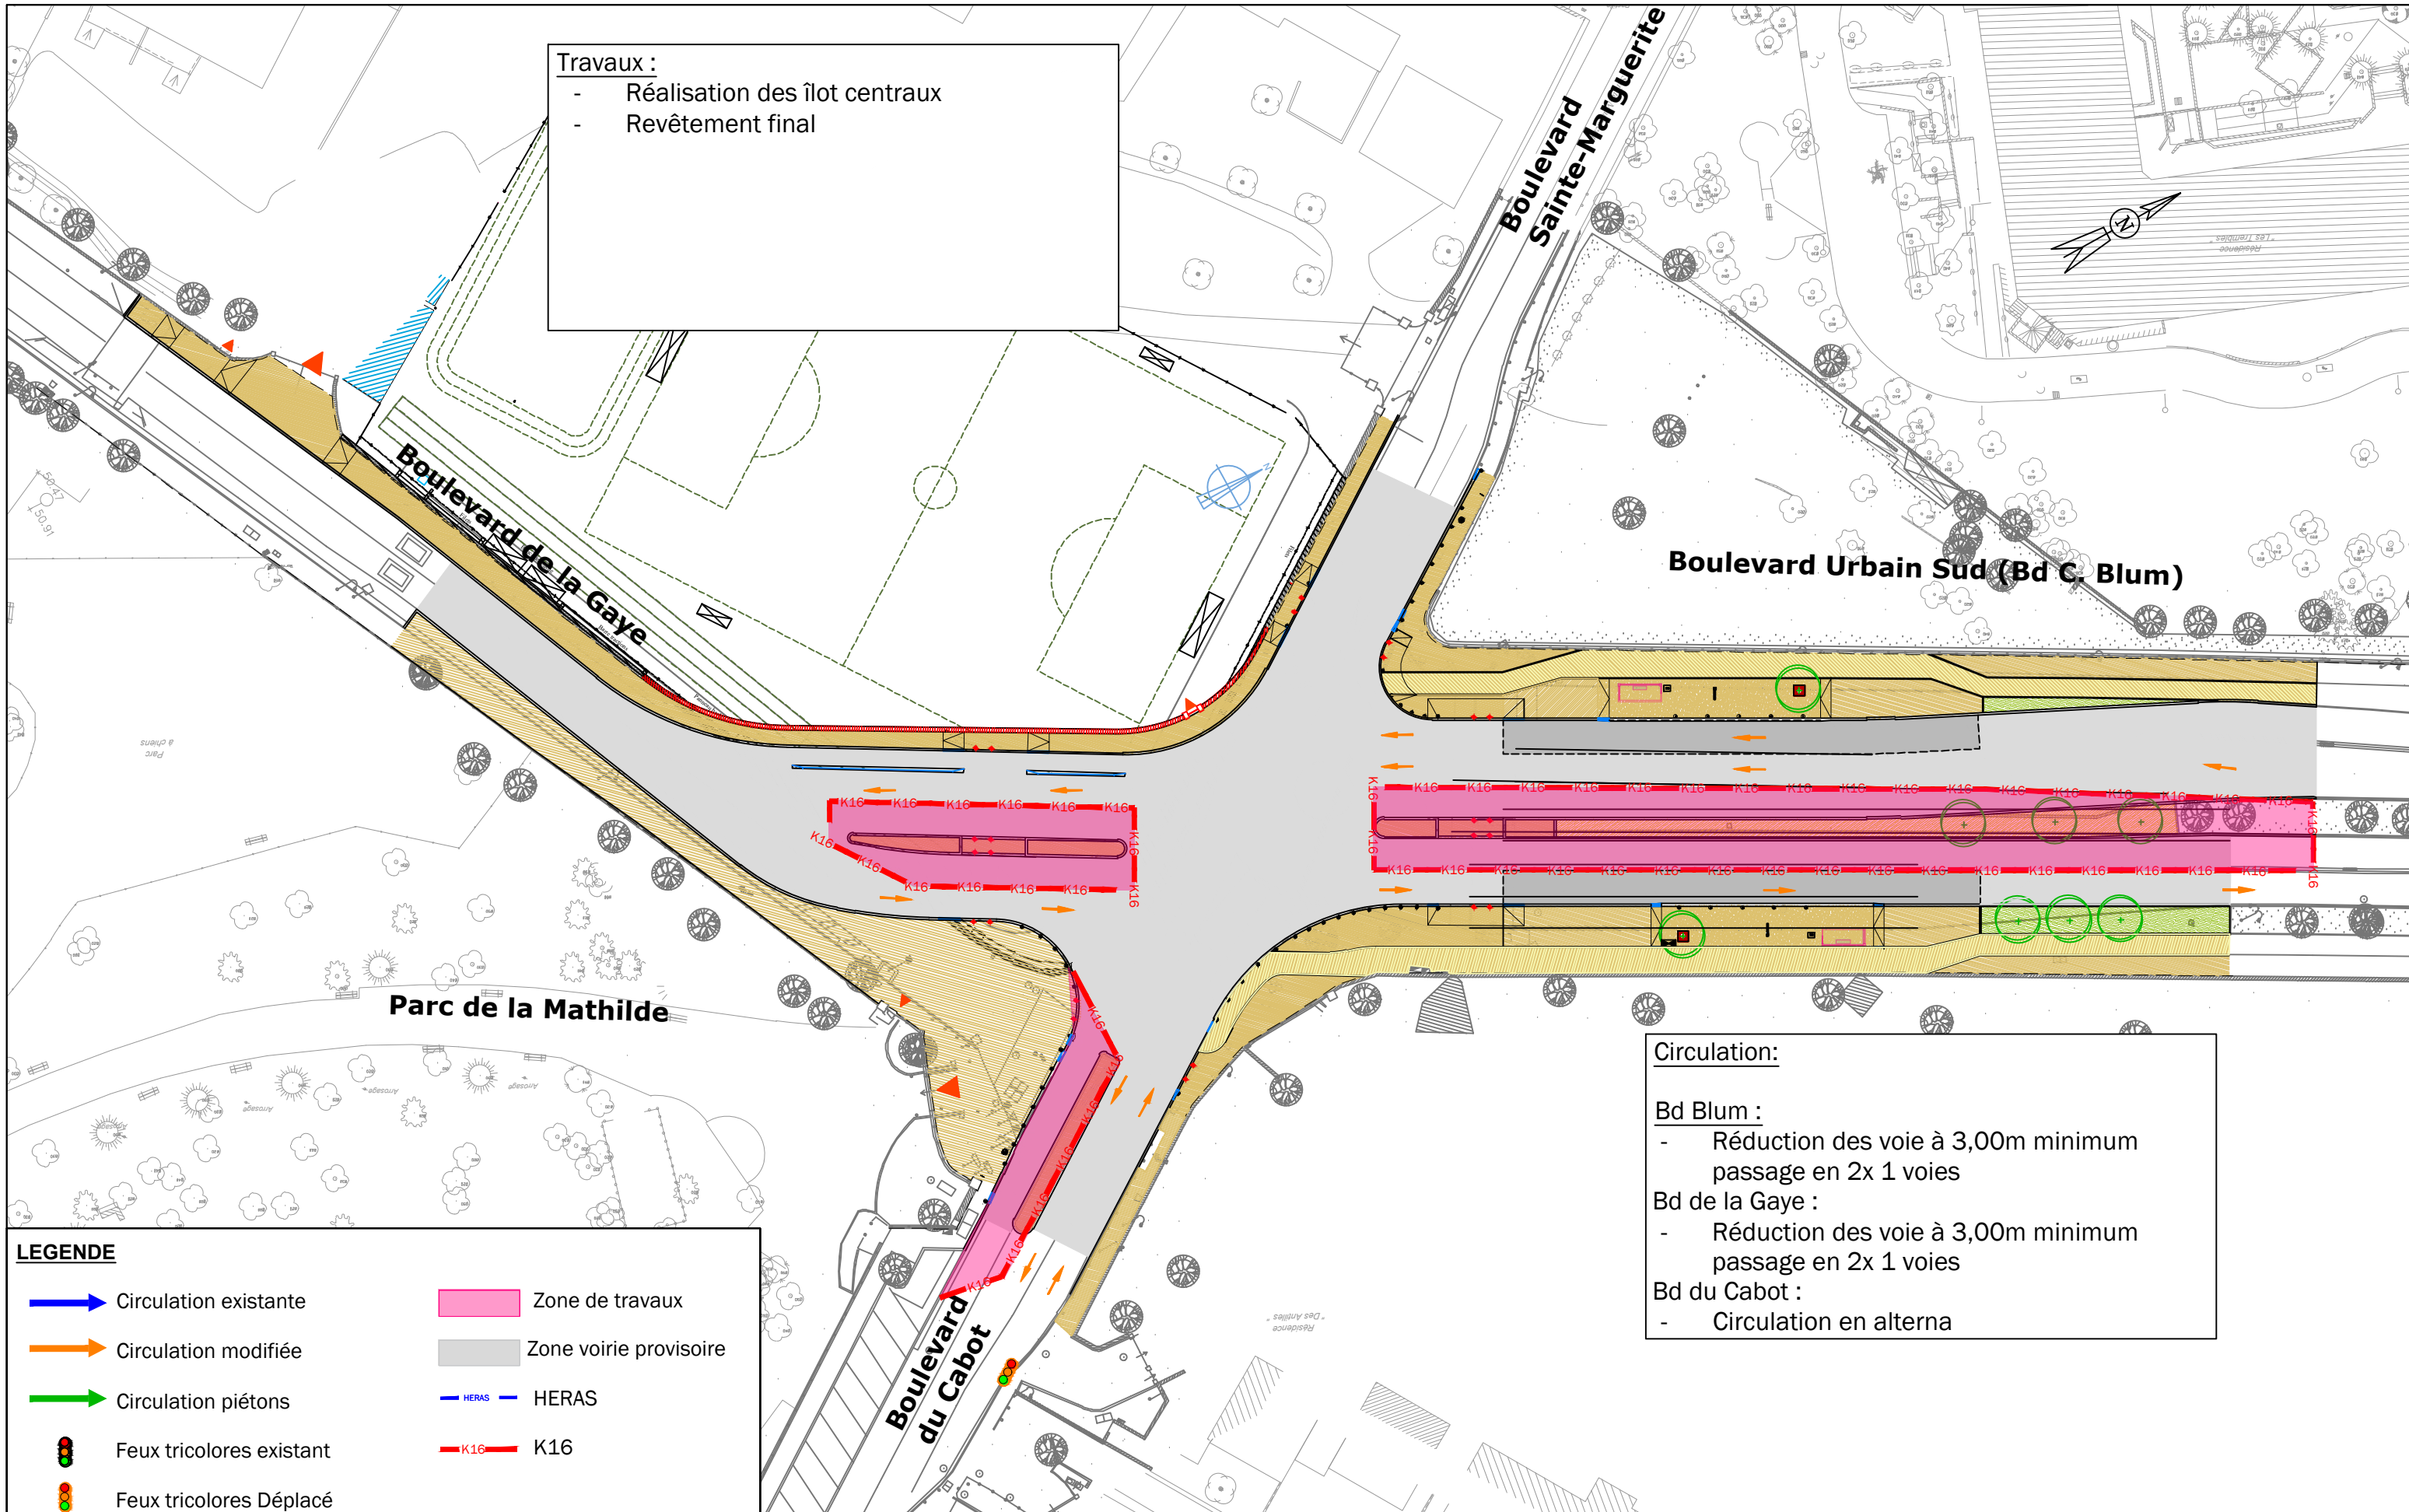

Travaux :

- Réalisation des îlot centraux
- Revêtement final

Circulation:

Bd Blum :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1 voies

Bd de la Gaye :

- Réduction des voie à 3,00m minimum passage en 2x 1 voies

Bd du Cabot :

- Circulation en alterna

LEGENDE

	Circulation existante		Zone de travaux
	Circulation modifiée		Zone voirie provisoire
	Circulation piétons		HERAS
	Feux tricolores existant		K16
	Feux tricolores Déplacé		

spie batignolles
malet
spie batignolles
travaux publics

AMENAGEMENT CARREFOUR BLUM - GAYE

Carrefour provisoire entre le boulevard Catherine Blum et le Boulevard de la Gaye à Marseille (9ème Ardt)

PHASE 7b - CIRCULATION DE JOUR

Revêtements et îlots centraux - Travaux de nuit

Date:

Indice:
